

令和6年9月26日

# (仮称)勝島人道橋整備工事説明会

品川区



# 次 第

- ① 挨拶
- ② 職員紹介（品川区・施工業者）
- ③ 事業概要
- ④ (仮称)勝島人道橋下部工整備工事について
- ⑤ 質疑応答




### ③事業概要



# (仮称) 勝島人道橋 事業概要



# (仮称) 勝島人道橋 事業概要

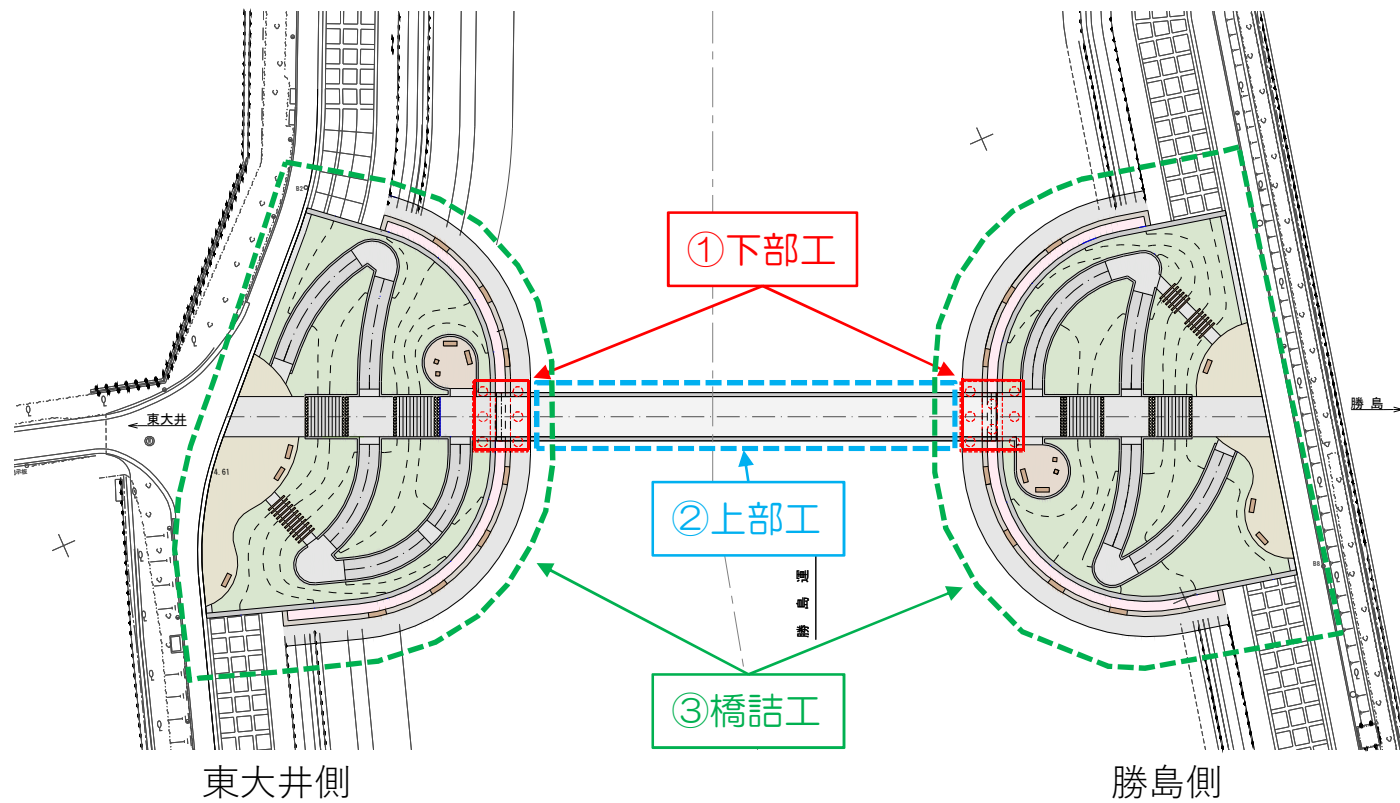





# イメージパース

勝島側



東大井側

# (仮称) 勝島人道橋 事業概要

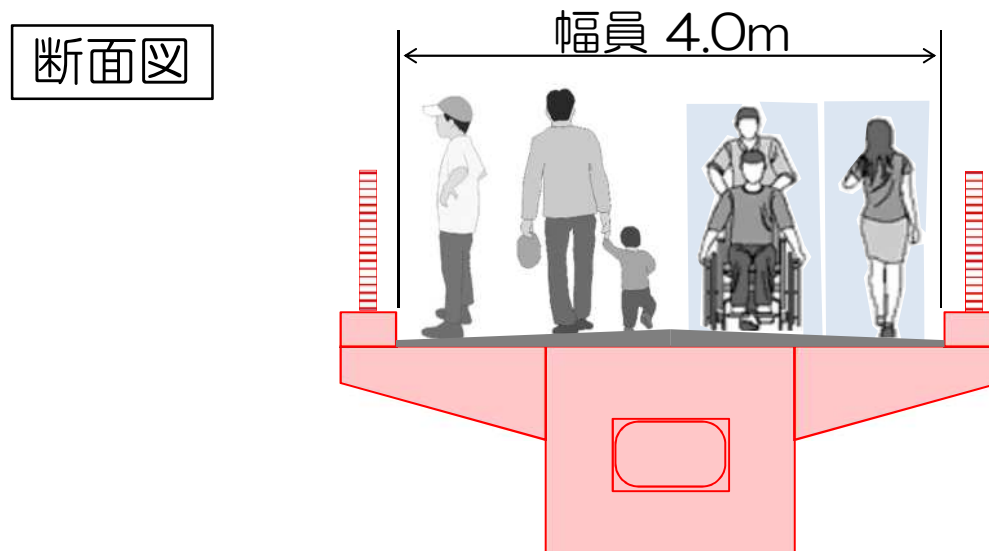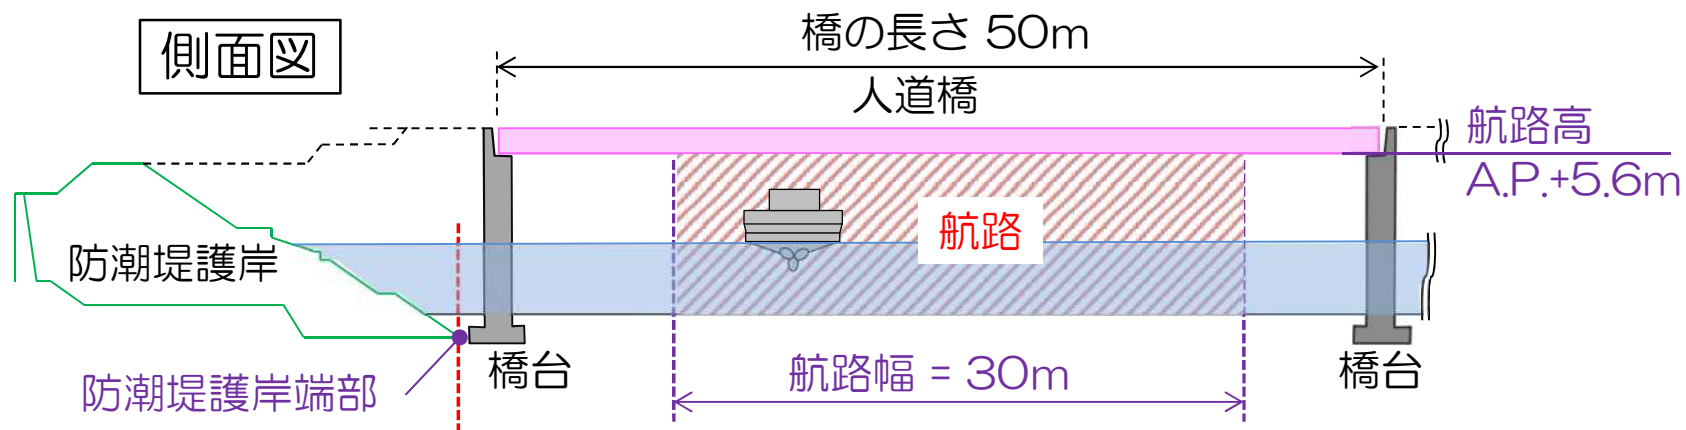

※A.P. . . . 荒川基準水面

# 今後のスケジュール（予定）

|    | R6年度                                       | R7年度                             | R8年度 | R9年度                    | R10年度 |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|-------|
| 内容 | <p>●工事説明会</p> <p>（仮称）勝島人道橋<br/>下部工整備工事</p> | <p>（仮称）勝島人道橋<br/>上部工・橋詰工整備工事</p> |      | <p>しながわ花海道<br/>改修工事</p> |       |




## ④(仮称)勝島人道橋の下部工整備工事について



# 下部工整備工事について

橋梁構造イメージ図

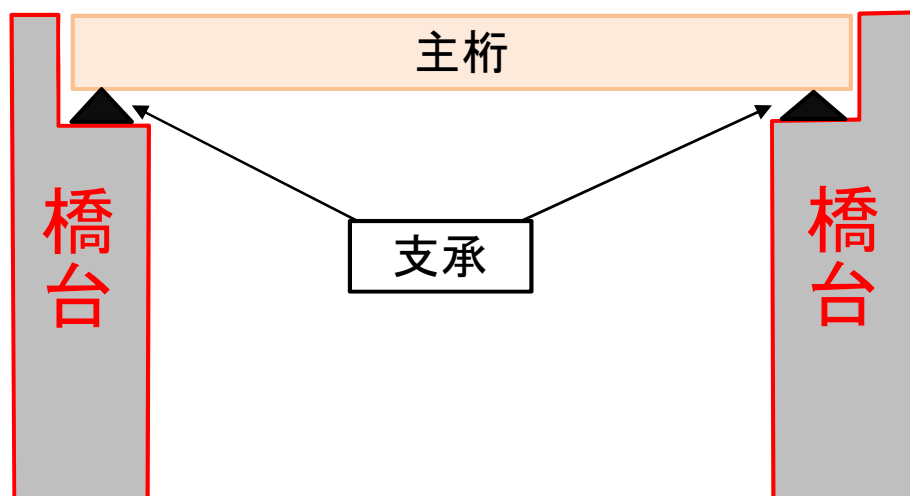

かもめ橋 橋台



# 下部工整備工事について


かもめ橋 橋脚



イメージパース




## 下部工工事施工フロー図

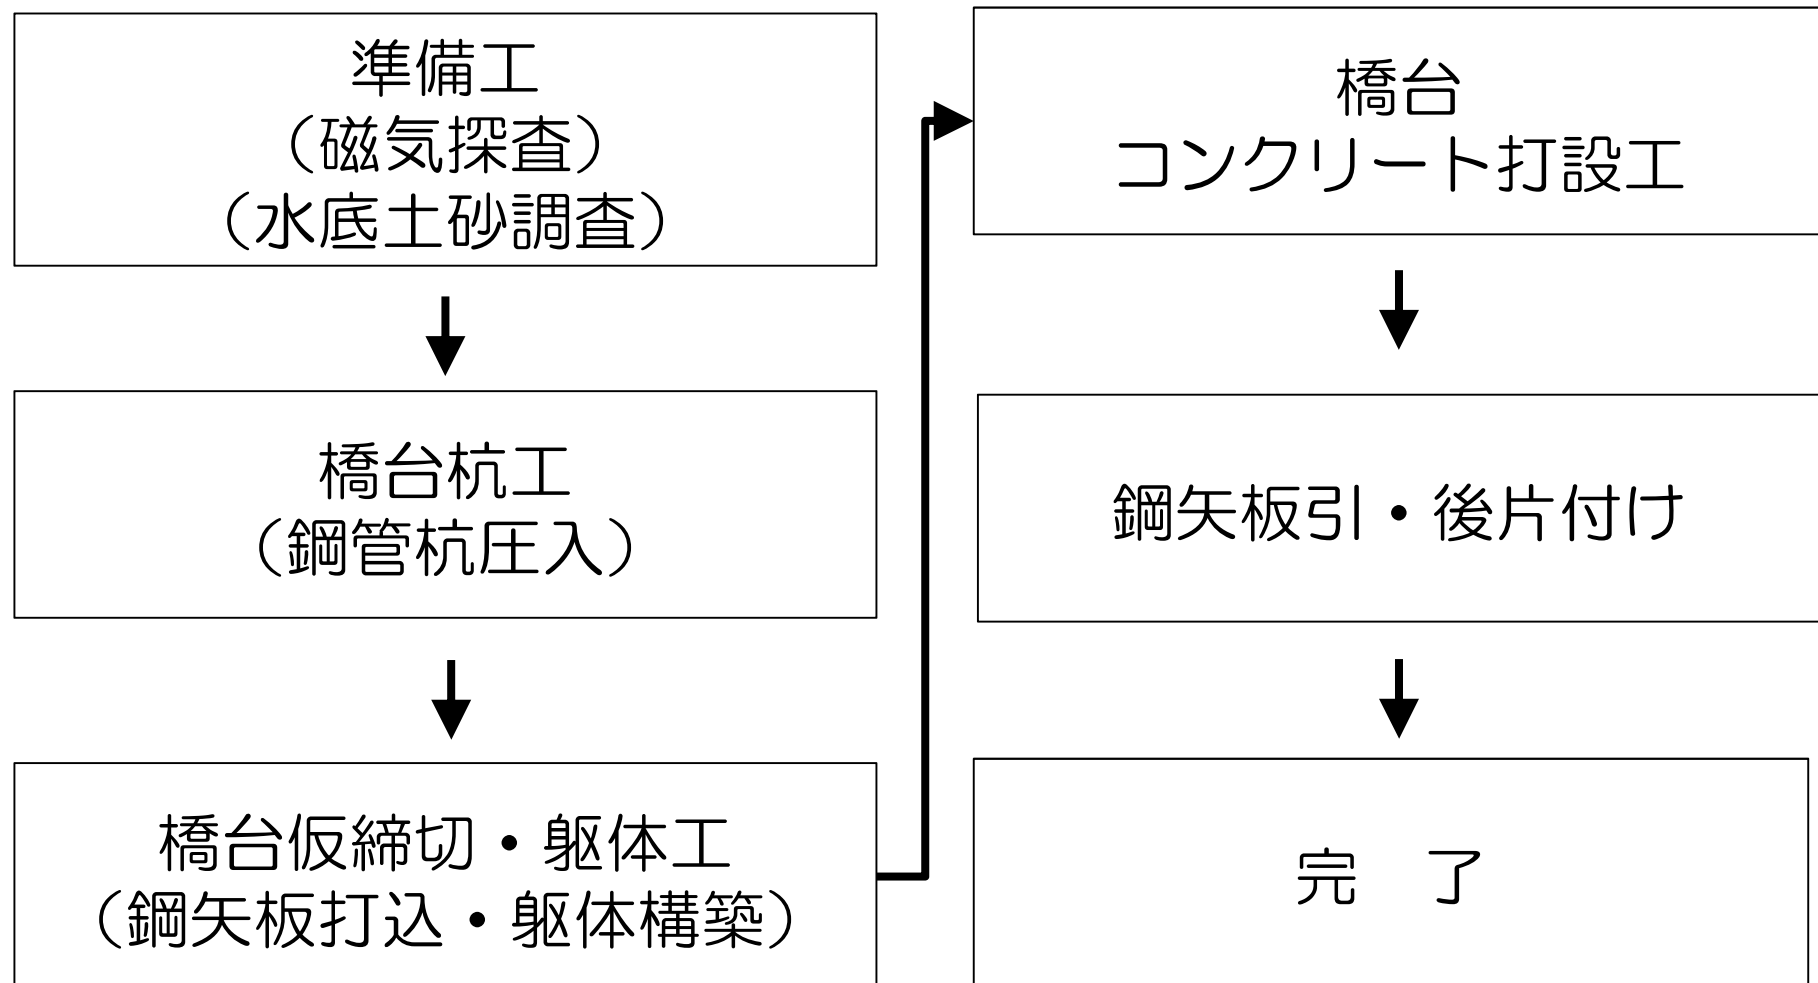


# 今後のスケジュール（予定）

下部工整備工事工程表

|               | 令和6年                                                                              |                                                                                   |    | 令和7年                                                                                |   |   |                                                                                       |   |   |   |   |   |                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (月)           | 10                                                                                | 11                                                                                | 12 | 1                                                                                   | 2 | 3 | 4                                                                                     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                                    |
| 準備工           |  |                                                                                   |    |                                                                                     |   |   |                                                                                       |   |   |   |   |   |                                                                                       |
| 橋台杭工          |                                                                                   |  |    |                                                                                     |   |   |                                                                                       |   |   |   |   |   |                                                                                       |
| 橋台仮締切<br>躯体工  |                                                                                   |                                                                                   |    |  |   |   |                                                                                       |   |   |   |   |   |                                                                                       |
| コンクリート<br>打設工 |                                                                                   |                                                                                   |    |                                                                                     |   |   |  |   |   |   |   |   |                                                                                       |
| 鋼矢板引抜<br>後片付け |                                                                                   |                                                                                   |    |                                                                                     |   |   |                                                                                       |   |   |   |   |   |  |




# 下部工整備工事施工フロー図

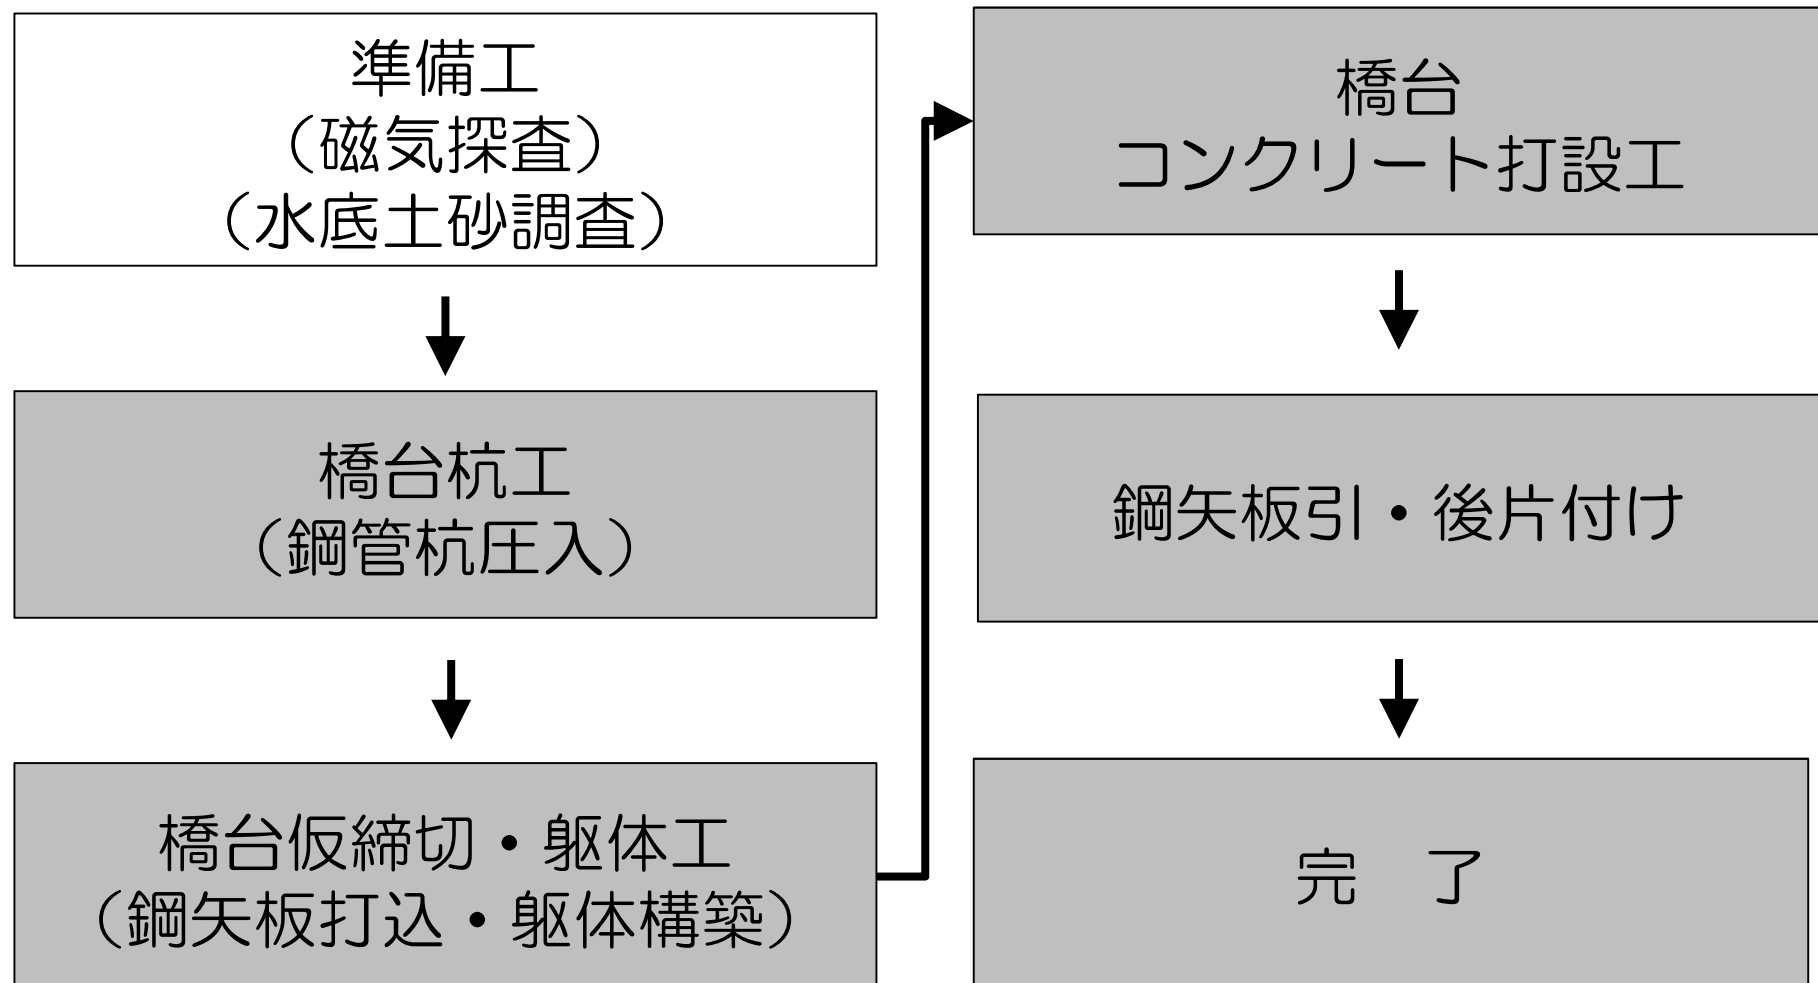


# 施工図（準備工：磁気探査・水底土砂調査）

平面図

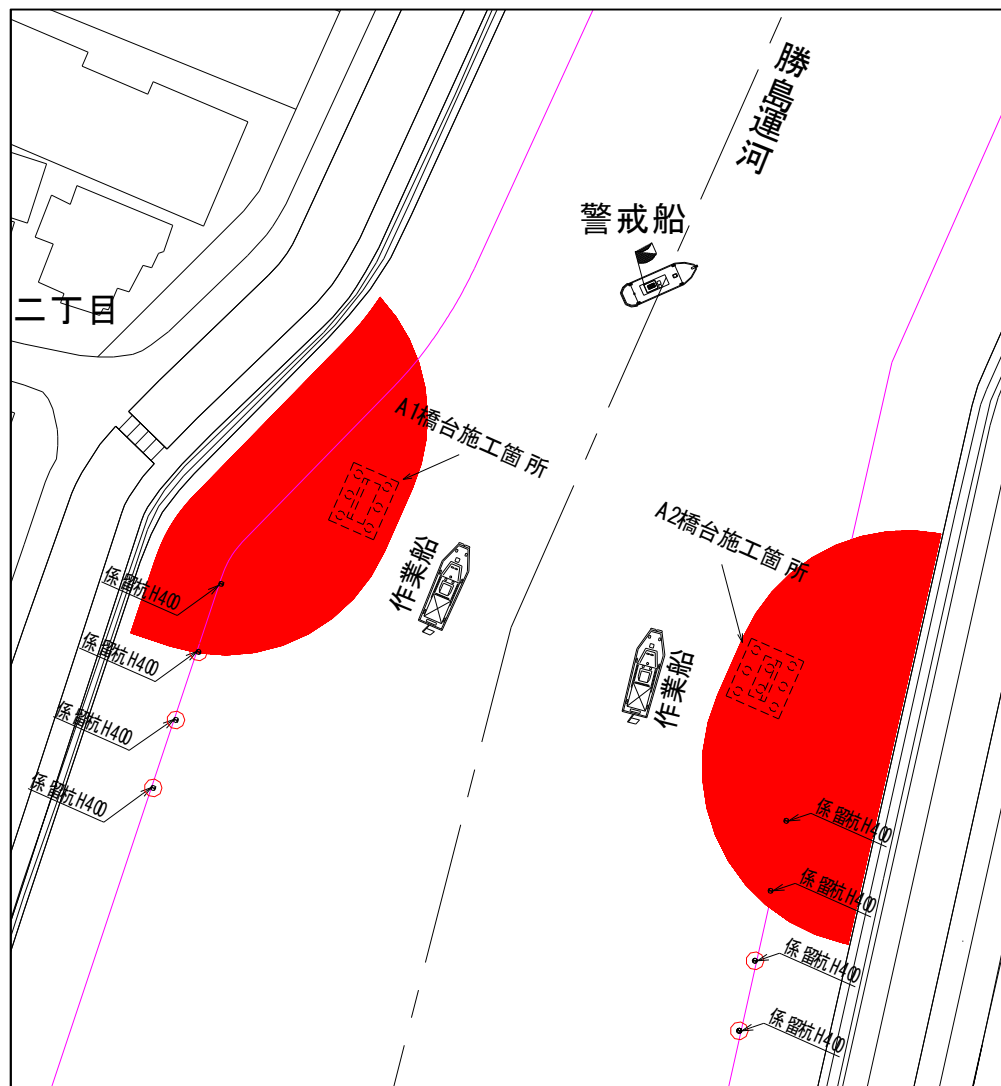


断面図

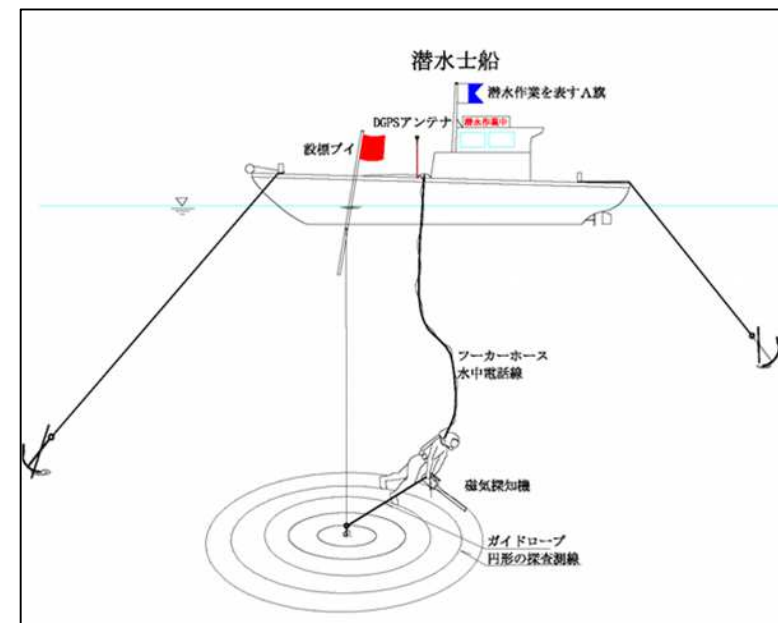


実施期間  
10月中旬～下旬

## 下部工工事施工フロー図

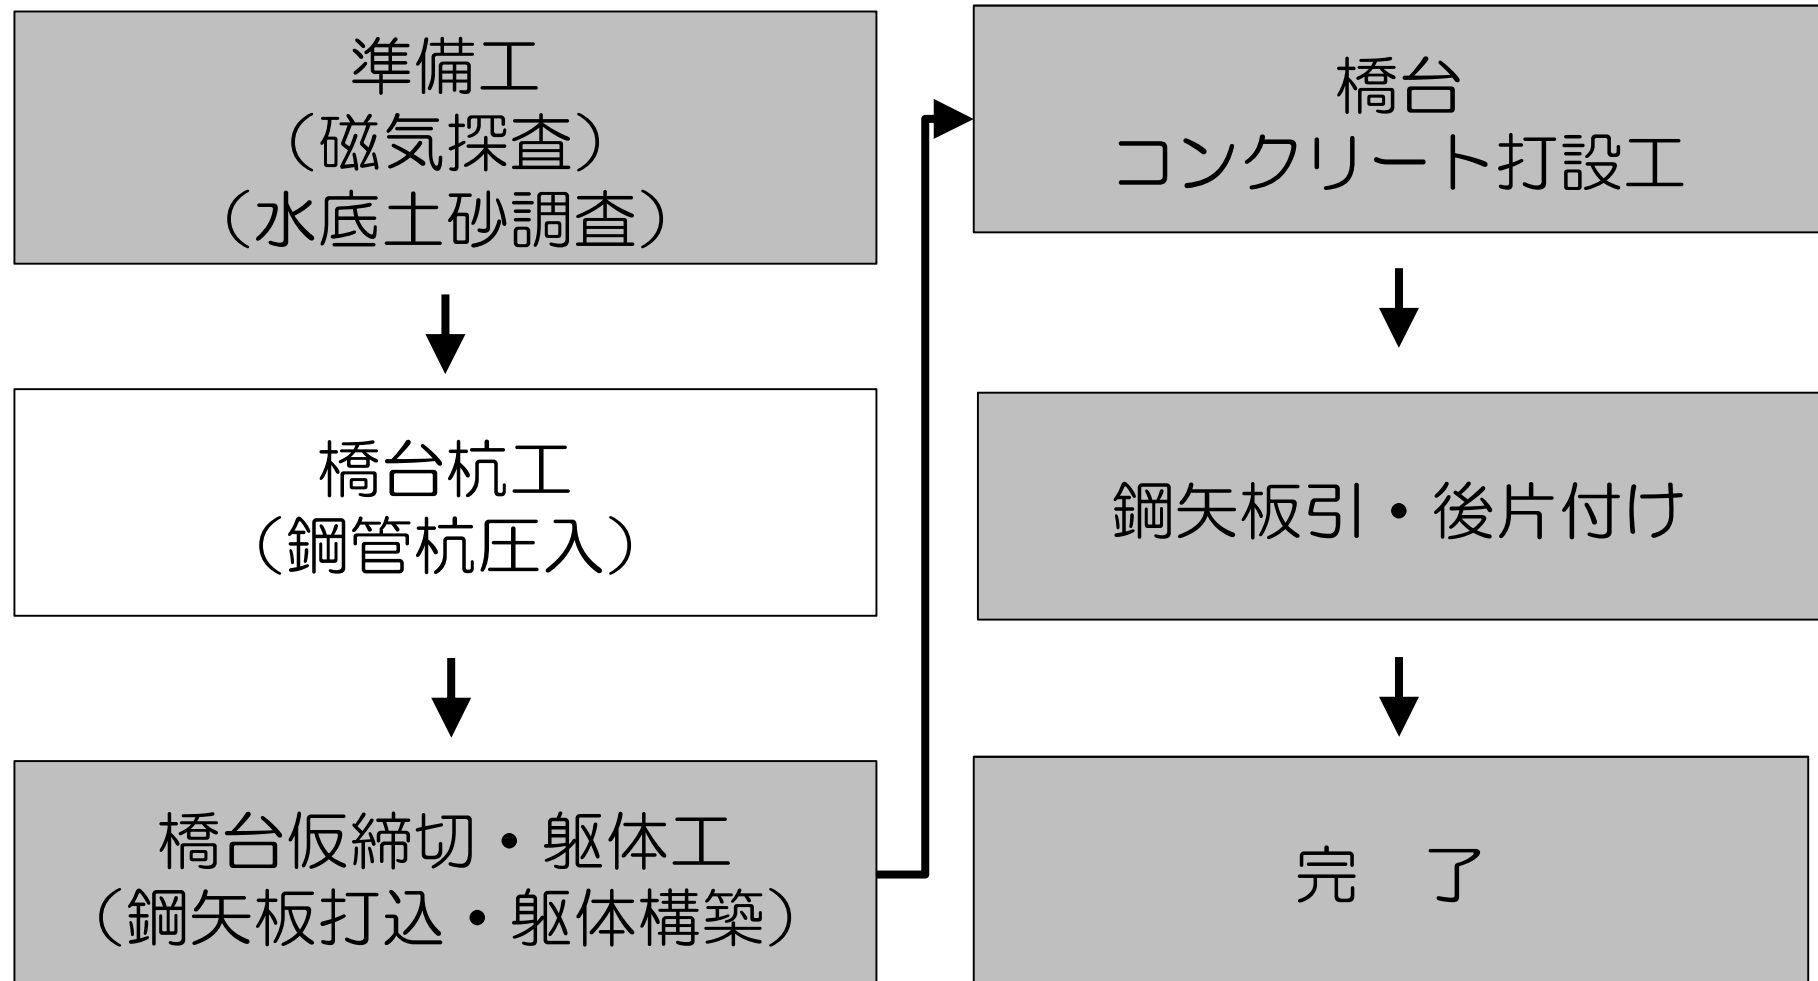


# 施工図（橋台杭工：鋼管杭圧入）

平面図

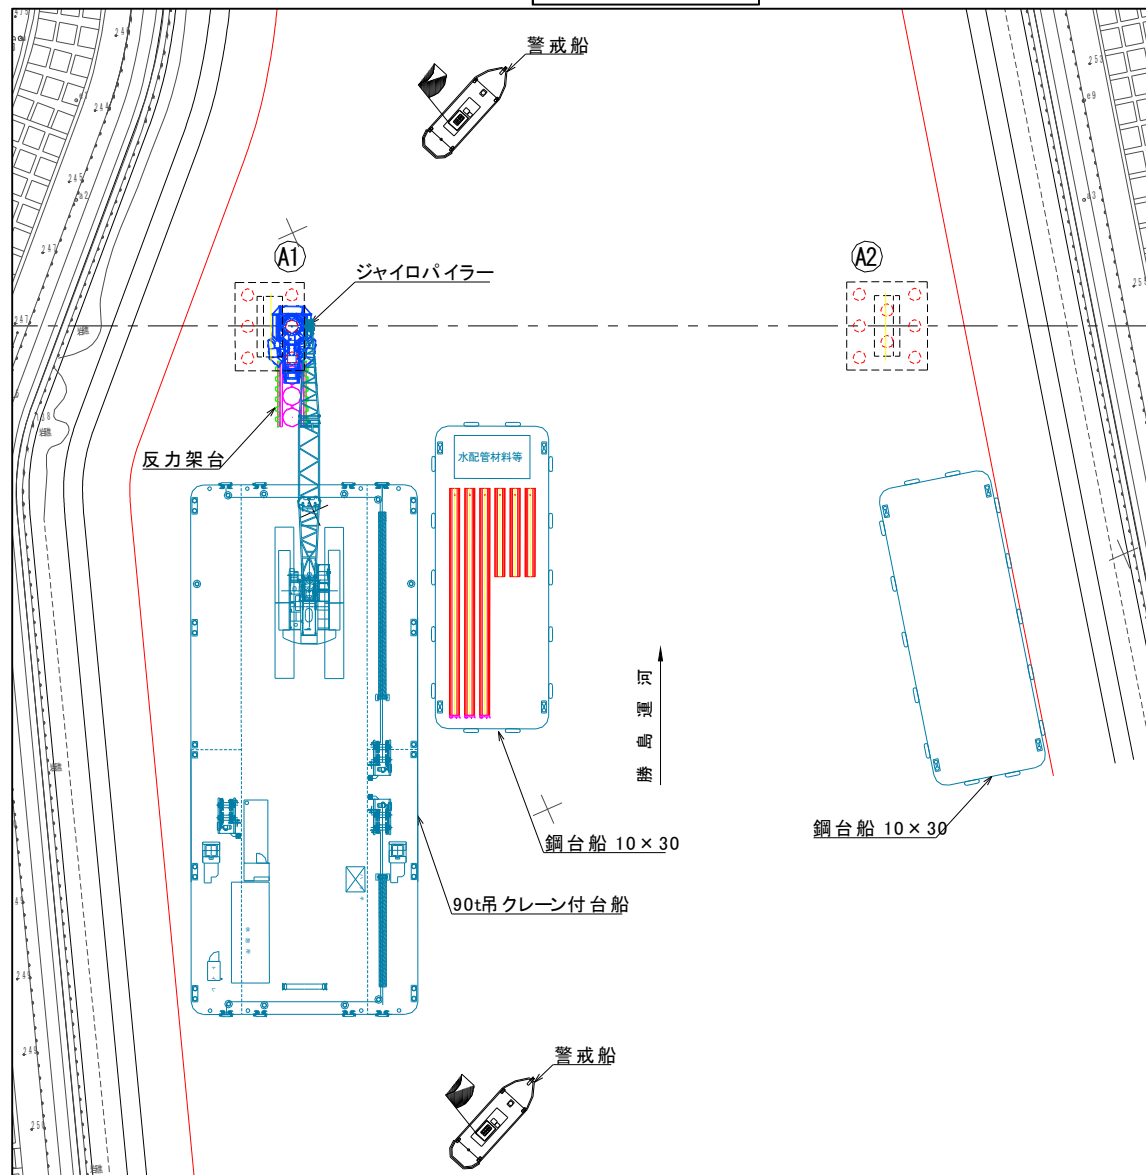

断面図

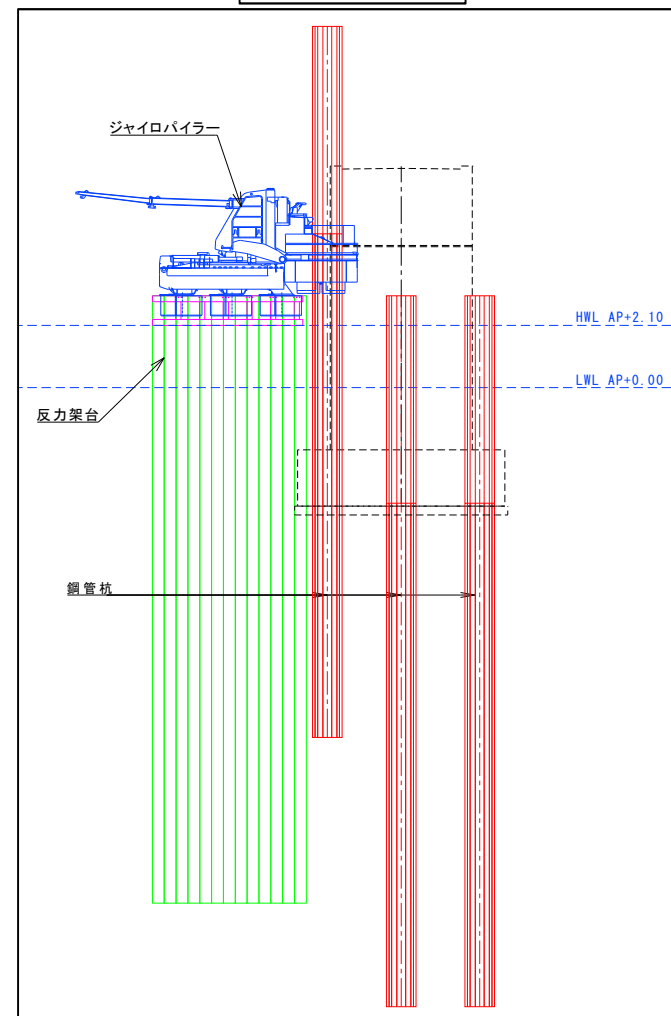

実施期間  
R6.11月～R7.1月

# 使用機械（橋台杭工：鋼管杭圧入）

鋼台船




クレーン台船



ジャイロパイラー




## 下部工工事施工フロー図

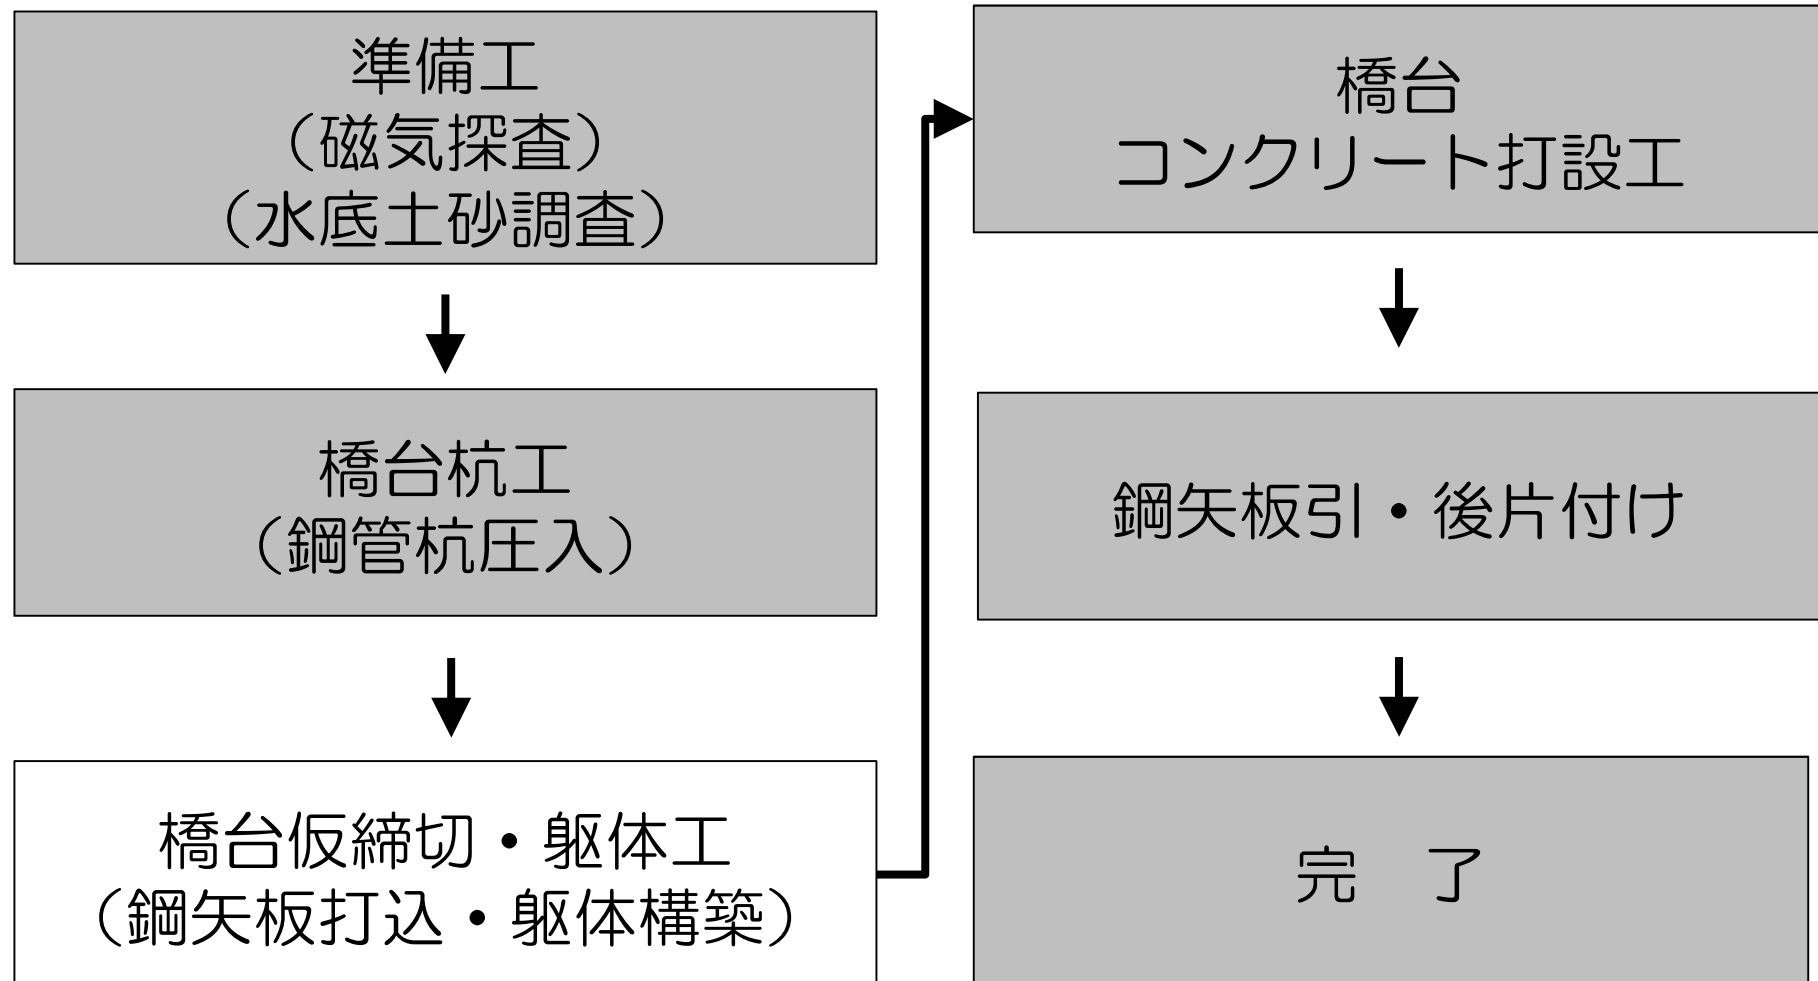




# 施工図（仮締切工～躯体工）

平面図

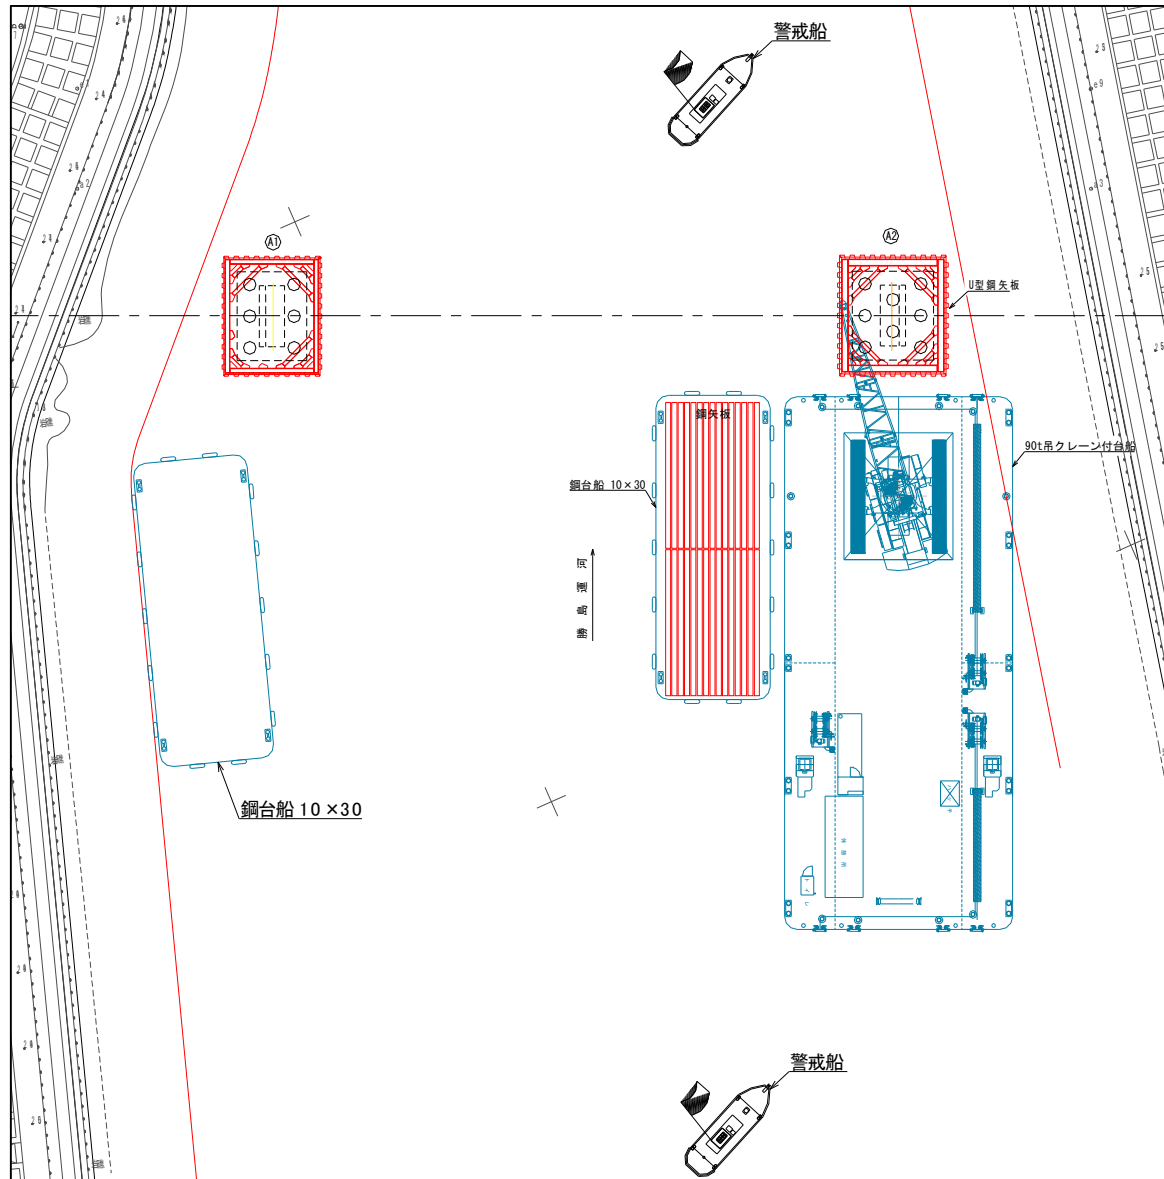

断面図

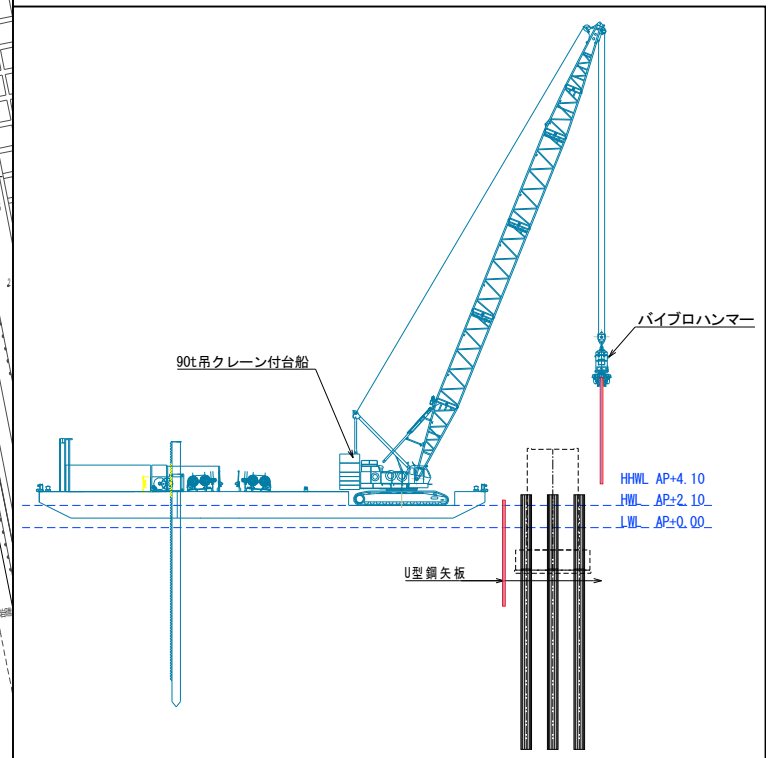

実施期間  
R7.1月～R7.9月

## 使用機械（仮締切工～躯体工）



鋼台船




クレーン台船


バイブロハンマー




## 下部工工事施工フロー図

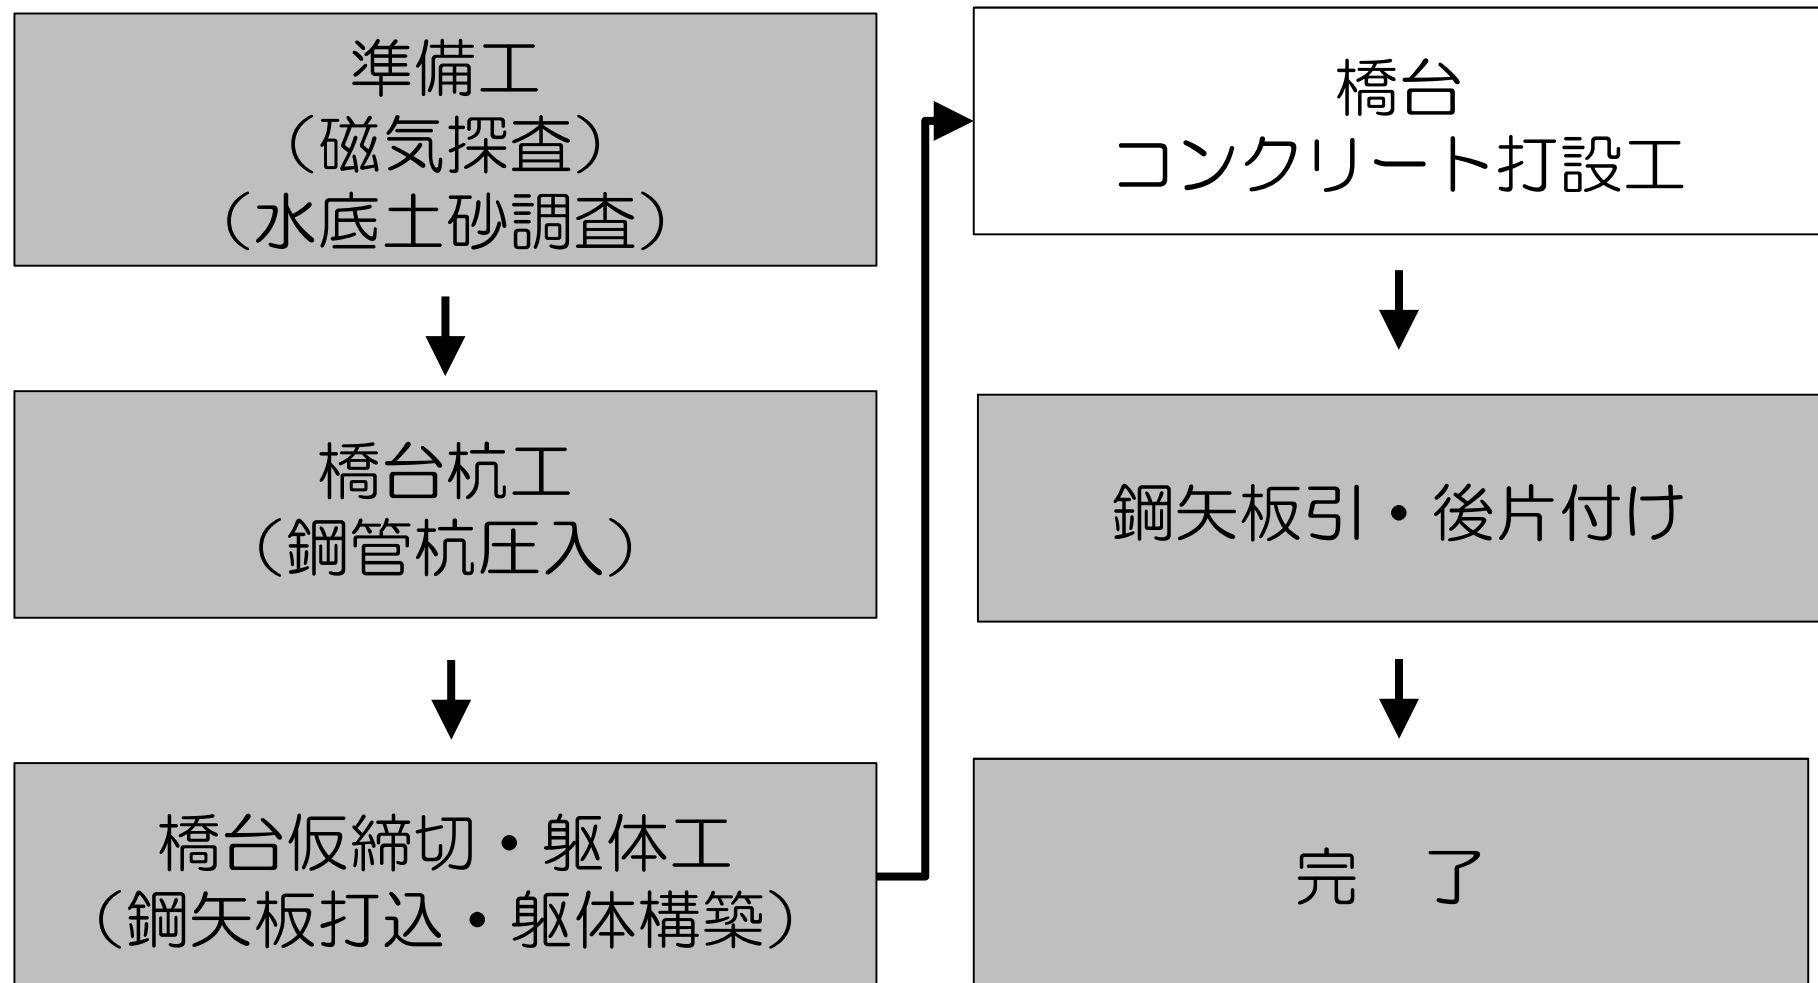

# 施工図（コンクリート打設）

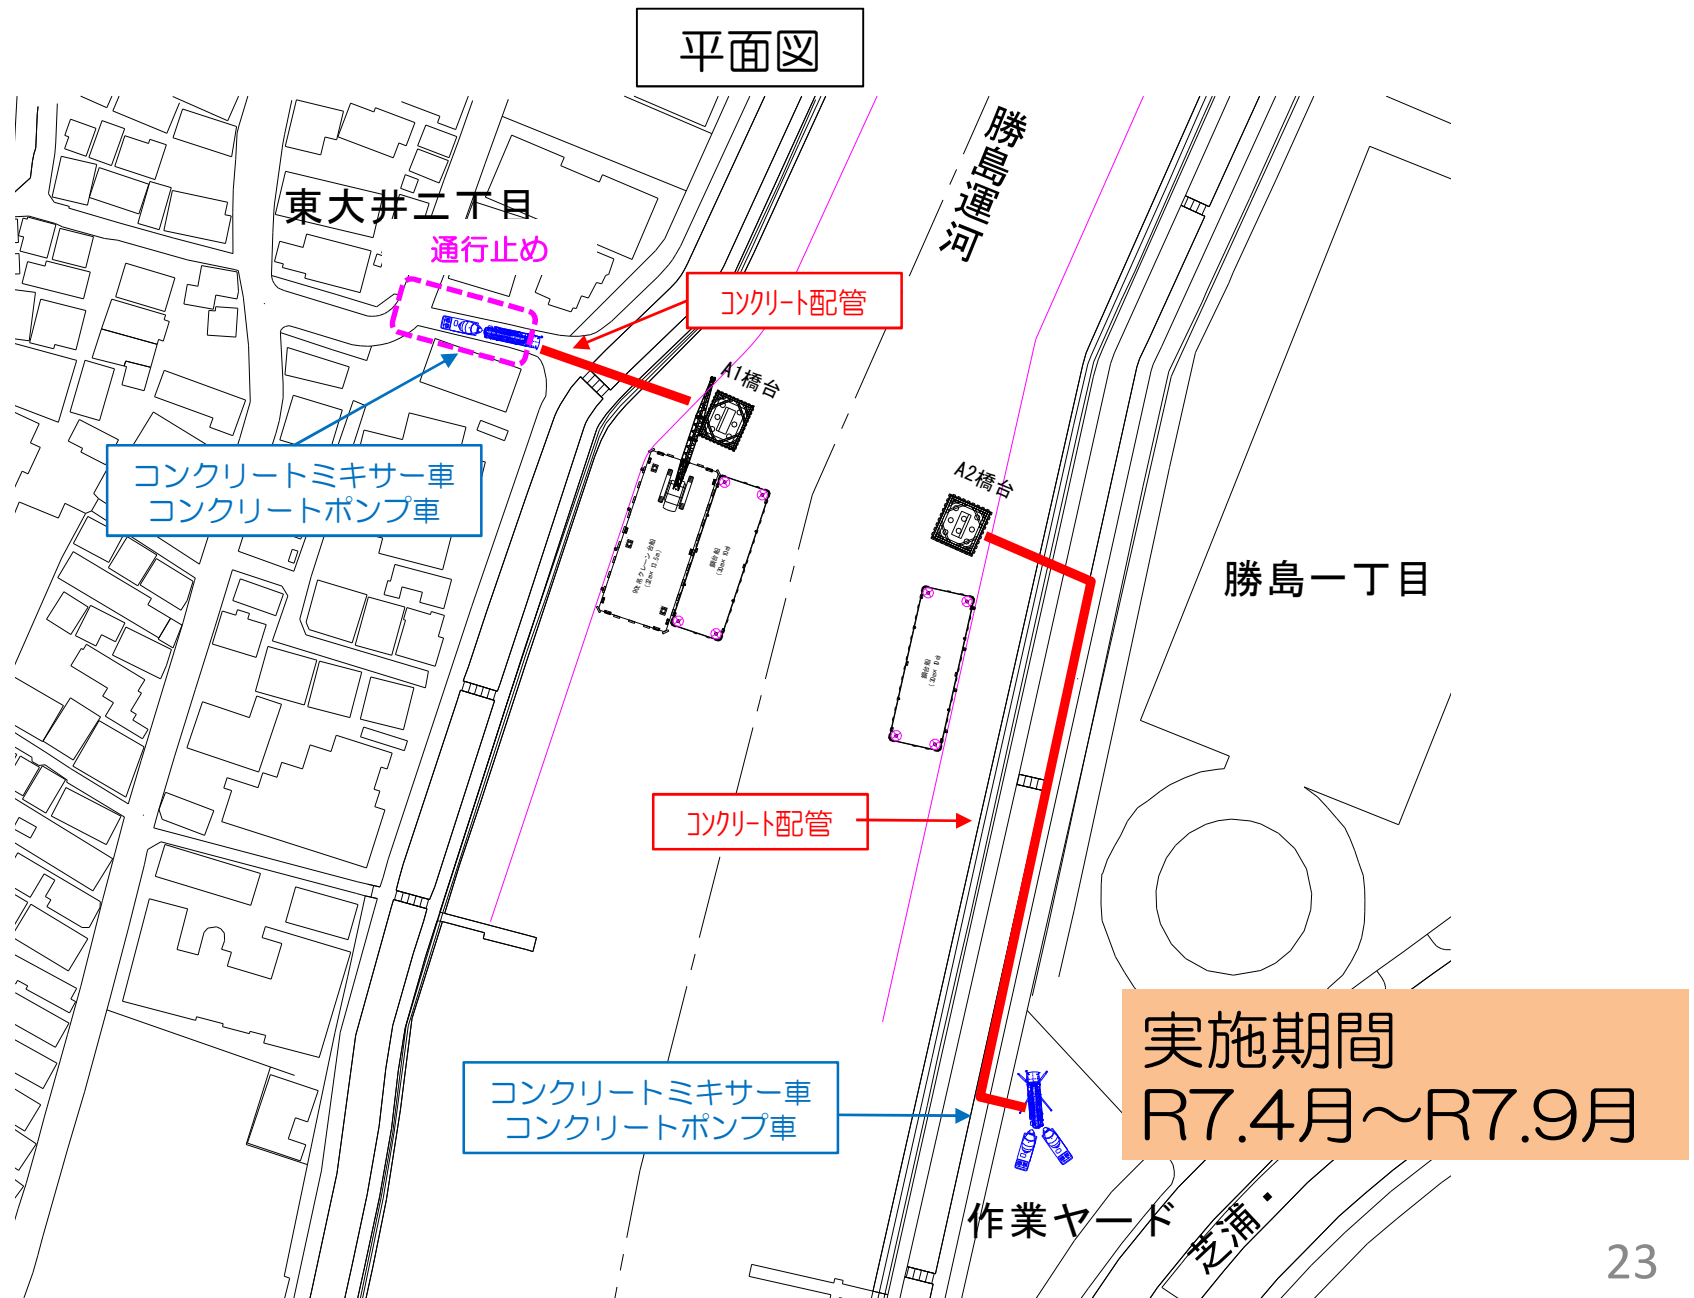

# 東大井側コンクリート打設時の迂回路

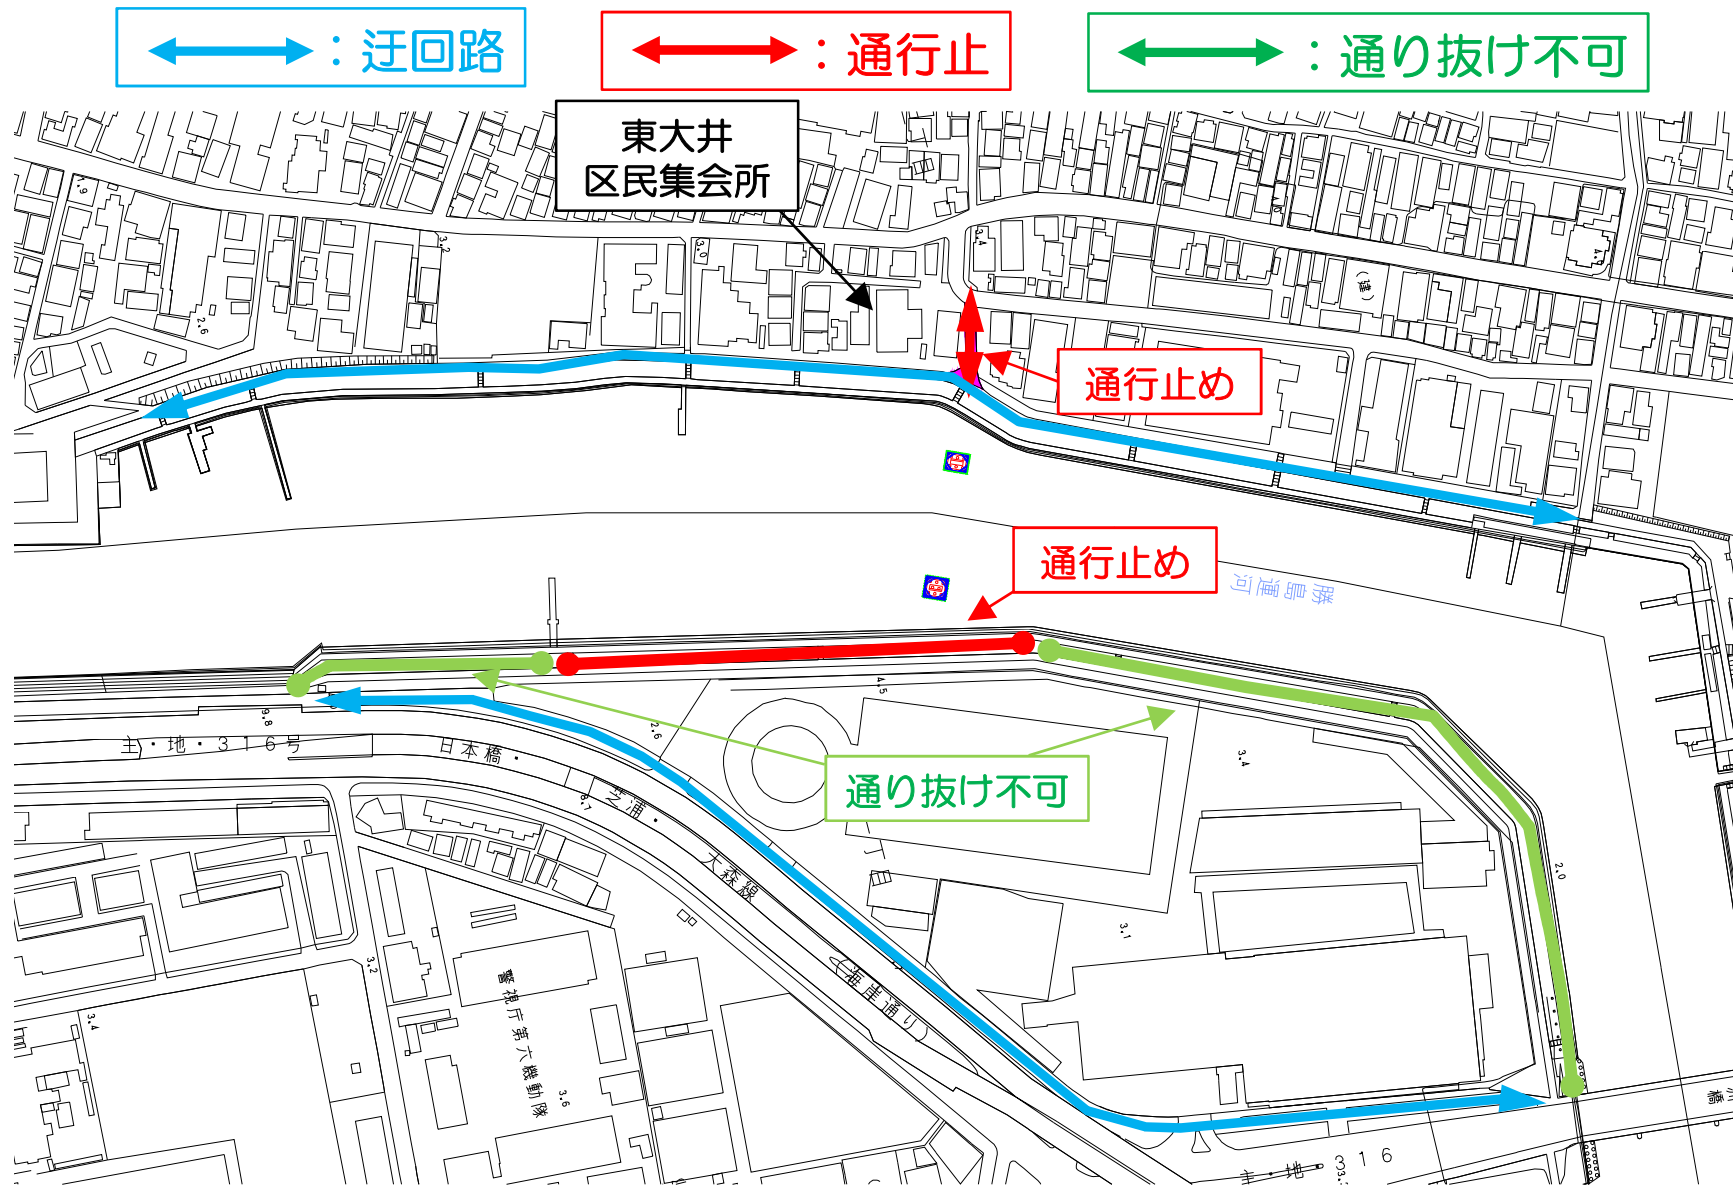

# 使用機械（コンクリート打設）

コンクリートポンプ車




コンクリートミキサー車  
(アジテータトラック)






## 下部工工事施工フロー図

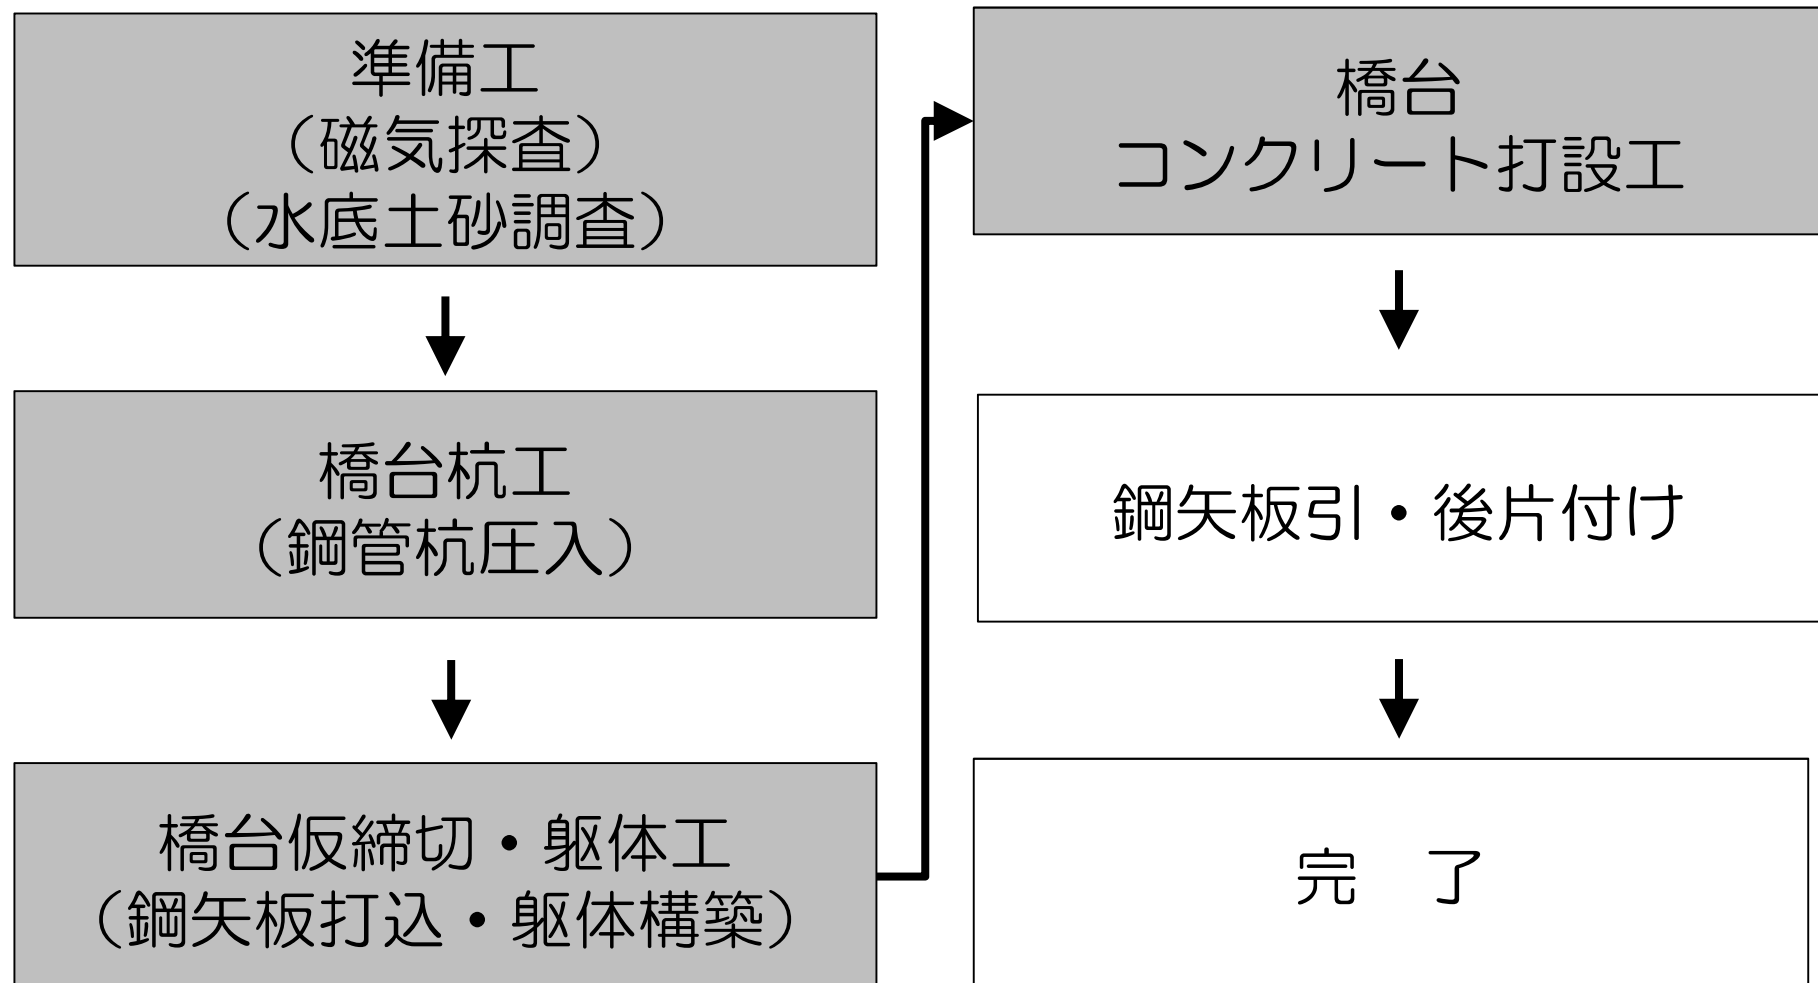




施工図（仮締切工：鋼矢板引き抜き）

平面图

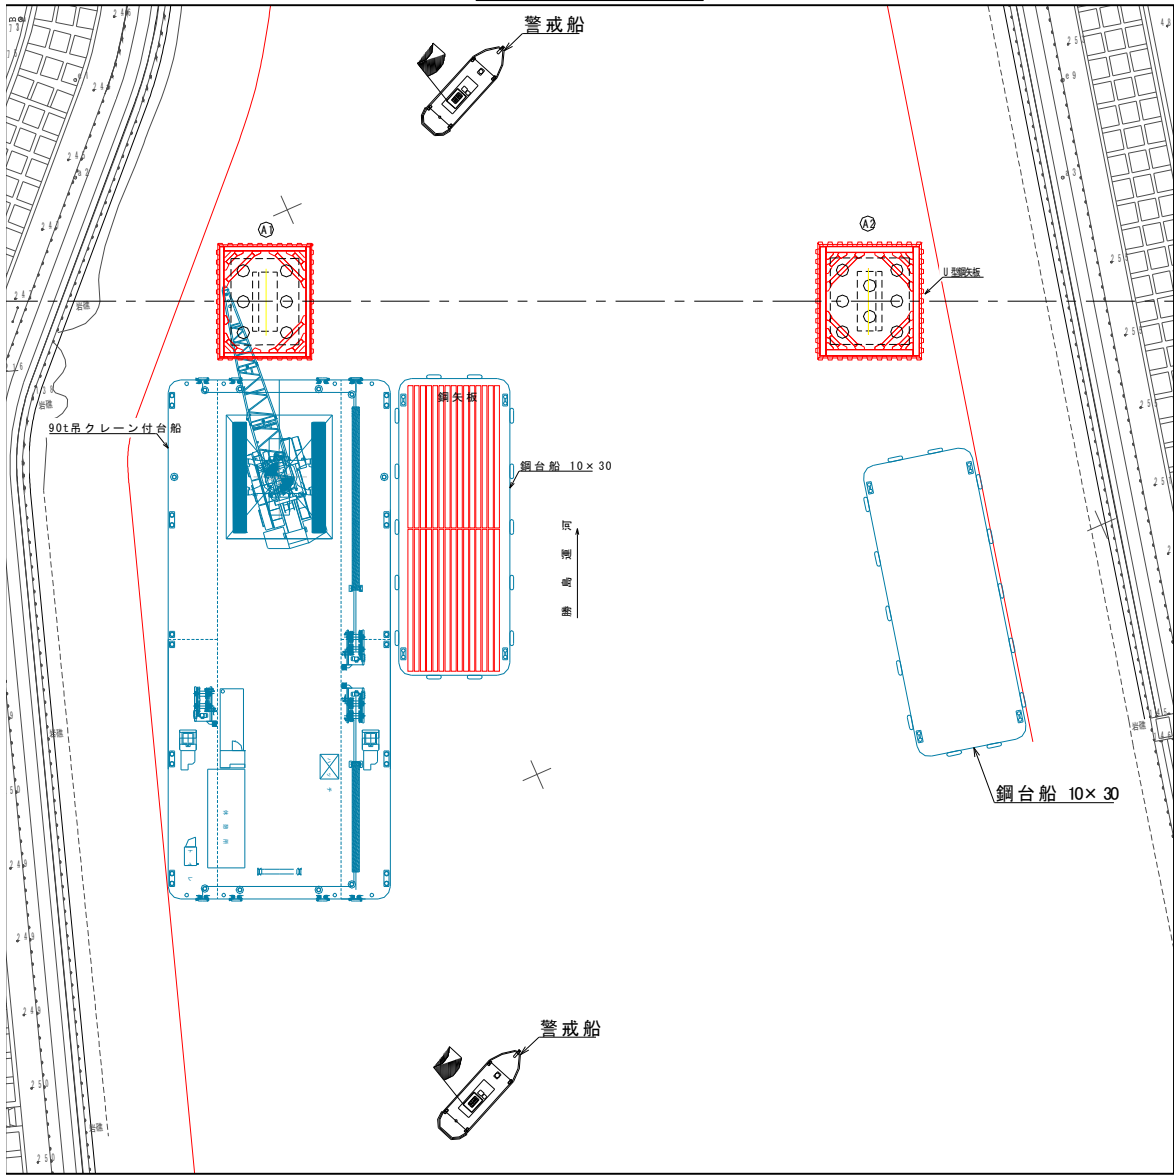

## 断面図

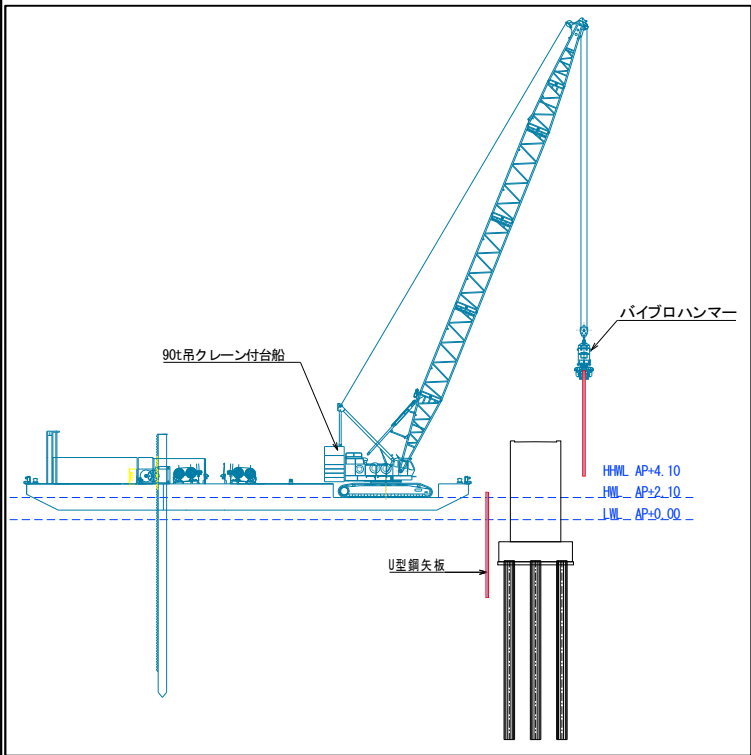

実施期間  
R7.10月～10月末

## 使用機械（仮締切工～躯体工）



鋼台船



クレーン代船

バイブロハンマー



# ご協力のお願い

## ○地域の皆様へ、ご理解とご協力のお願い

### 工事全般

- 令和6年10月中旬より人道橋下部工の工事を着手します。
- 工事に当たっては不要な騒音や振動が生じないよう低騒音型、低振動型の建設機械を使用します。また、オペレーターや作業員に対して指導を行い作業を行います。

### 作業時間

- 作業時間は8:00～18:00です。  
但し、クレーン台船の入出域については、勝島橋、首都高速、モノレールの桁下高さ制限があるため、潮位の状況により夜間の18:00～8:00に実施する場合があります。

### 交通規制

- 作業ヤード整備、コンクリート打設時等、一部の車道、歩道を規制して工事を行います。警察との協議を行い、交通誘導員の配置や保安設備の設置等の適切な安全対策を実施します。

工事期間中は、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

## 契約情報

### （仮称）勝島人道橋下部工整備工事

契約金額：621,500,000円

履行期間：令和6年7月11日～令和7年10月31日

請負業者：大旺新洋・鈴木建設共同企業体

### （仮称）勝島人道橋下部工整備工事施工監理委託

契約金額：17,200,000円

履行期間：令和6年9月9日～令和7年10月31日

請負業者：株式会社メイワ・イー・シー

# 問合せ先

## ○（仮称）勝島人道橋について

品川区 防災まちづくり部 道路課 道路建設担当

（担当：田端、山本）

TEL 03-3777-1111（内線）5491

FAX 03-5742-6886

## ○ 下部工整備工事について

大旺新洋・鈴中建設共同企業体

（担当：現場代理人・監理技術者：青木 主任技術者：山田）

TEL 03-6404-9225

FAX 03-6404-9226

## ○しながわ花海道の整備について

品川区 防災まちづくり部 公園課 公園建設担当

（担当：川畑、彦坂）

TEL 03-3777-1111（内線）5499

FAX 03-5742-9127
